

玉湯まがたま学園整備 工事進捗状況（令和2年4月末）

■進捗率（校舎・幼稚園・児童クラブ建設工事） 36.3%
 （屋内運動場建設工事） 19.7%

■進捗状況



上空より現場全景撮影

R2.4.28 撮影



上空より現場全景撮影

R2.4.28 撮影




屋内運動場北面より現場全景撮影 R2.4.29 撮影



屋内運動場南面より現場全景撮影 R2.4.29 撮影

■建物配置図

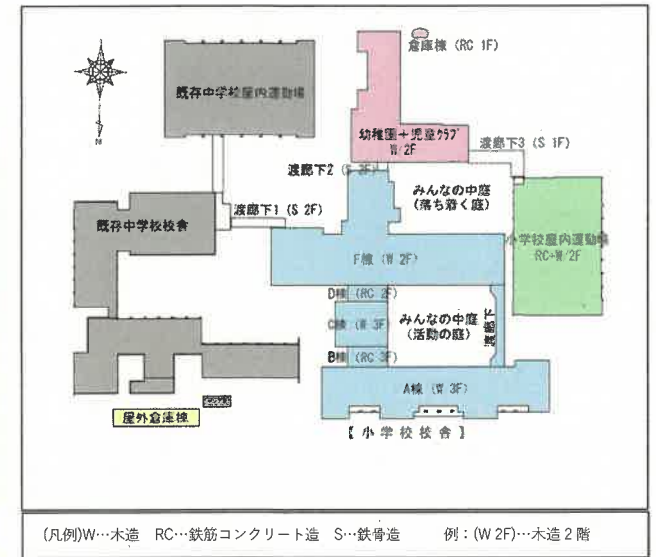

■主な4月作業内容および今後の予定など

【校舎棟】

- ・A棟：木軸建て方作業完了（4/20）
- ・F棟：柱脚金物据付開始（4/20～）

【屋内運動場】

- ・リ-寸：土間コンクリート打設完了（4/30）

《今後の予定》

【校舎棟】

- ・F棟：木軸建て方（5/25～）

【屋内運動場】

- ・1F：スラブコンクリート打設（5/11、5/13）
- ・1F：躯体工事開始（5/18）
