

## 玉湯まがたま学園整備 工事進捗状況 (令和元年 10月末)

■進捗率 (校舎・幼稚園・児童クラブ建設工事) 4.59%

■進捗状況



上空より現場全景撮影

R1.10.31 撮影



上空より現場全景撮影

R1.10.31 撮影



東方向より撮影 (校舎 A 棟)


R1.10.31 撮影



東方向より撮影 (校舎 F 棟)

R1.10.31 撮影

■建物配置図

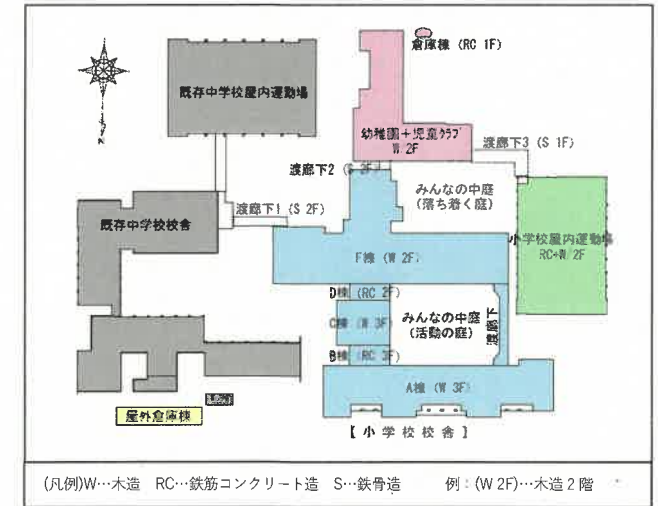

■主な 10 月作業内容および今後の予定など

### 【行事】

- 全国都道府県教育委員会施設助成担当係長会議  
(10/15: 玉湯まがたま学園整備事業事例発表)

### 【校舎棟】

- 基礎型枠工事着手 (10/7~)
- A 棟 2 工区: 基礎ベース打設 (10/11)
- A 棟 2 工区: 基礎地中梁打設 (10/21)
- B 棟基礎打設 (10/23)
- E 棟基礎打設 (10/31)

### 《今後の予定》

- 11/12~13 松江工業高等学校  
生徒・インターナショナル
