

## 玉湯まがたま学園整備 工事進捗状況 (令和元年 11 月末)

■進捗率 (校舎・幼稚園・児童クラブ建設工事) 6.60%

■進捗状況



上空より現場全景撮影


R1.11.29 撮影



上空より現場全景撮影

R1.11.29 撮影

■建物配置図

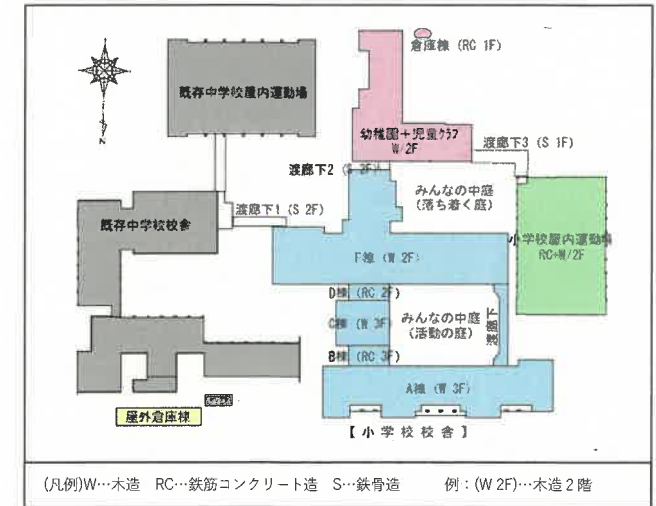

■主な 11 月作業内容および今後の予定など

【行事】

- ・松江工業高校インターナショナル (11/12~13)

【校舎棟】

- ・A棟 1工区：基礎地中梁打設 (11/8)
- ・F棟 1工区：基礎ベース打設 (11/9)
- ・D棟：基礎打設 (11/21)

《今後の予定》

- ・校舎棟 EV 鉄骨建て方 (12/27~)



東方向より撮影 (校舎 A 棟)

R1.11.29 撮影



東方向より撮影 (校舎 F 棟)

R1.11.29 撮影
