

玉湯まがたま学園整備 工事進捗状況（令和2年1月末）

- 進捗率（校舎・幼稚園・児童クラブ建設工事） 17.2%
- （屋内運動場建設工事） 2.6%

■進捗状況



上空より現場全景撮影

R2.1.22 撮影



上空より現場全景撮影

R2.1.31 撮影




屋内運動場北面より現場全景撮影 R2.1.31 撮影



屋内運動場南面より現場全景撮影 R2.1.31 撮影

■建物配置図

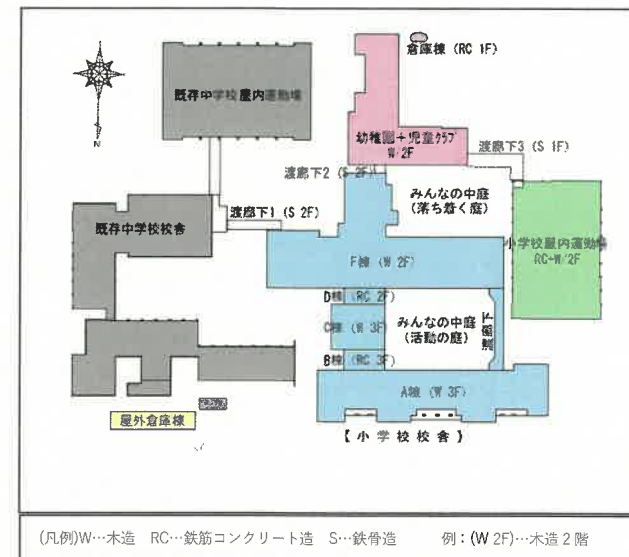

■主な1月作業内容および今後の予定など

【校舎棟】

- ・F棟2工区：基礎地中梁打設（1/16）
- ・B棟：1F 躯体打設（1/20）
- ・A棟：木構造軸組建方（1/27～）

【屋内運動場棟】

- ・現地測量業務（1/6～1/29）

《今後の予定》

【校舎棟】

- ・E棟：鉄骨建方（2/8～）

【屋内運動場棟】

- ・柱状改良杭工事（2/5～）
