

玉湯まがたま学園整備 工事進捗状況（令和2年7月末）

■進捗率（校舎・幼稚園・児童クラブ建設工事） 55.6%
 （屋内運動場建設工事） 37.0%

■進捗状況



上空より現場全景撮影 R2.7.31 撮影



上空より現場全景撮影 R2.7.31 撮影




屋内運動場北面より現場全景撮影 R2.7.31 撮影



屋内運動場南面より現場全景撮影 R2.7.31 撮影

■建物配置図

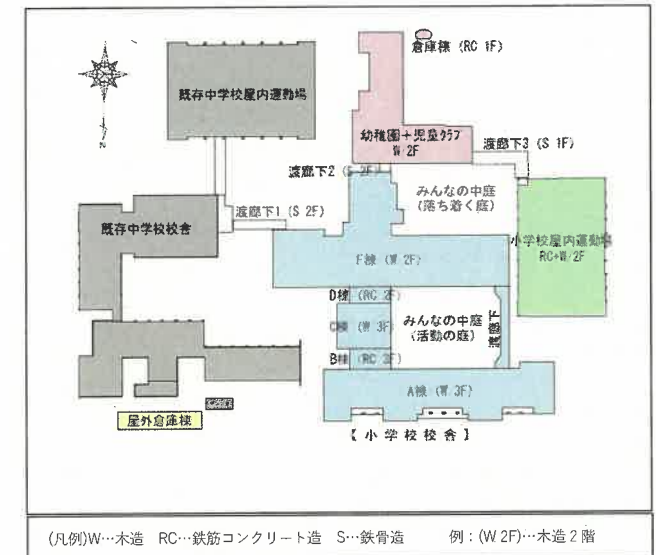

■主な7月作業内容および今後の予定など

- 【校舎棟・幼稚園棟】
- ・幼稚園棟：基礎コンクリート打設（7/15）
 - ・屋外倉庫棟：基礎工事（7/23～）
- 【屋内運動場】
- ・2F躯体コンクリート打設（7/17）
- 《今後の予定》
- 【校舎棟・幼稚園棟】
- ・幼稚園棟：木造建て方（8/17～）
- 【屋内運動場】
- ・屋根トラス組み建方（8/24）
