

玉湯まがたま学園整備 工事進捗状況（令和2年3月末）

■進捗率（校舎・幼稚園・児童クラブ建設工事） 30.8%  
 （屋内運動場建設工事） 15.3%

■進捗状況



上空より現場全景撮影

R2.3.26 撮影



上空より現場全景撮影

R2.3.26 撮影




屋内運動場北面より現場全景撮影 R2.3.31 撮影



屋内運動場南面より現場全景撮影 R2.3.31 撮影

■建物配置図

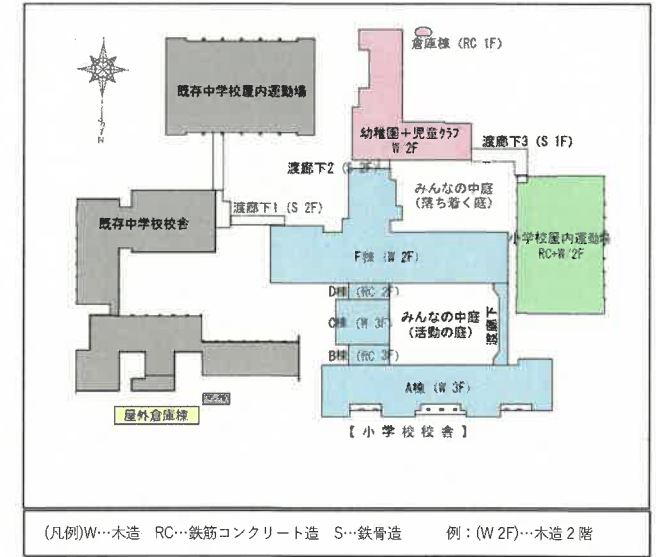

■主な3月作業内容および今後の予定など

【校舎棟】

- F棟：土間コンクリート打設（3/18完了）
- A棟：木軸建て方作業

【屋内運動場】

- 基礎工事  
根切、基礎地中梁配筋、型枠組

《今後の予定》

【校舎棟】

- F棟：内外部足場組立（4/27～）

【屋内運動場】

- 基礎地中梁コンクリート打設（4/4、4/6）
- アリーナ土間コンクリート打設（4/30）
