

玉湯まがたま学園整備 工事進捗状況（令和2年5月末）

■進捗率（校舎・幼稚園・児童クラブ建設工事） 41.6%
 （屋内運動場建設工事） 24.6%

■進捗状況



上空より現場全景撮影 R2.5.28 撮影



上空より現場全景撮影 R2.5.28 撮影




屋内運動場北面より現場全景撮影 R2.5.30 撮影



屋内運動場南面より現場全景撮影 R2.5.30 撮影

■建物配置図

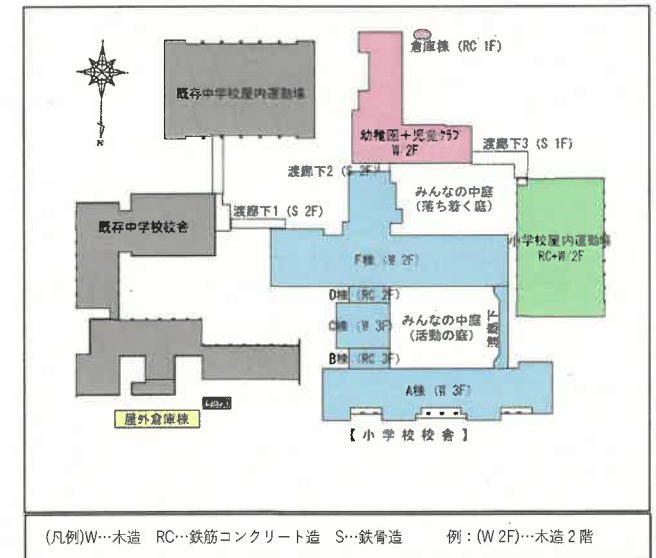

■主な5月作業内容および今後の予定など

【校舎棟】

- ・A棟：木軸工事完了（5/9）
- ・A棟：内外装工事着手（5/11～）

【屋内運動場】

- ・1F：スラブコンクリート打設（5/11、5/13）
- ・1F：躯体工事着手（5/18～）

《今後の予定》

【校舎棟】

- ・F棟：木軸建て方作業開始（6/4～）

【屋内運動場】

- ・1F：躯体コンクリート打設（6/19、6/24）
