

玉湯まがたま学園整備 工事進捗状況 (令和2年8月末)

■進捗率 (校舎・幼稚園・児童クラブ建設工事) 62.2%
 (屋内運動場建設工事) 47.8%

■進捗状況



上空より現場全景撮影 R2.8.31 撮影



上空より現場全景撮影 R2.8.31 撮影




屋内運動場北面より現場全景撮影 R2.8.31 撮影



屋内運動場南面より現場全景撮影 R2.8.31 撮影

■建物配置図

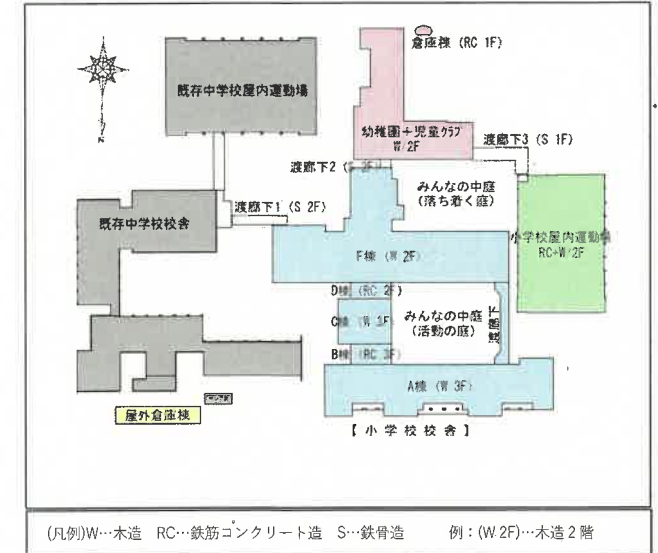

【校舎棟 幼稚園・児童クラブ棟】

- ・幼稚園・児童クラブ棟: 木造建て方 (8/17~)
- ・C棟: 木構造軸組建て方 (8/24~)

【屋内運動場】

- ・屋根トラス組み建て方 (8/24~)

《今後の予定》

【校舎棟】

- ・F棟2F: スラブ CON 打設 (9/5)

【屋内運動場】

- ・屋根鋼板葺き開始 (9/17~)
- ・内部仕上げ工事(天井、壁等)開始 (9/7~)
